

PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Alçada do Projeto

Federal

Estadual

Outros

MARÇO/2024

SUMÁRIO

1. Título do projeto.....	3
2. Proponente do projeto.....	3
3. Resumo.....	3
4. Contextualização	3
5. Objetivo Geral	4
5.1 Objetivos Específicos.....	4
Vínculo do projeto a uma estratégia nacional/regional de política pública	5
Metodologia.....	5
8.1. Público-alvo do projeto	5
8.2. Localização no território	6
8.3. Procedimentos	7
8.4. Estudos Ambientais.....	8
Meta (s)/ Etapa(s) do projeto.....	8
Resultado e Impacto esperado	13
Equipe gestora do projeto.....	13
Equipe executora.....	13
Equipe de apoio	13
Investimento	14
12.1. Fonte de recurso	14
12.2. Valor do projeto	15
12.3. Cronograma Físico-Financeiro.....	16
Gestão de Risco.....	19
13.1. Indicador do projeto	19
13.2. Análise de Risco.....	20
Referências.....	20
Anexos.....	20

1. Título do projeto

Promoção de Segurança Alimentar e Nutricional na Primeira Infância

2. Proponente do projeto

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES)

CNPJ: 02.940.097/0001-48

Endereço: R. das Gardêneas, 25 - Qd. 01 - Jardim Renascença, São Luís - MA

CEP: 65075-080.

3. Resumo

O Projeto está alinhado com o Plano Estratégico Maranhão 2050, o qual estabelece ações efetivas e consubstanciadas na intersetorialidade, como forma de viabilizar a interação entre as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política de Assistência Social. Inicialmente e prioritariamente, o público-alvo definido para este projeto é a primeira infância. É imprescindível a caracterização da situação nutricional dessa população, o que justifica a realização de pesquisas de avaliação do Índice de Insegurança Alimentar e Nutricional, associada à outras ações de execução direta, tais como: a implantação de Sistemas Agroalimentares de Segurança Alimentar e Nutricional; a dinamização e expansão de Banco de Alimentos, da Implantação de Sistemas Agroalimentares de Segurança Alimentar e Nutricional – SAASAN, da Implantação e implementação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional -SISAN municipais e da Implantação/Dinamização do Projeto “Leite para Todos”, que incentiva a produção e o consumo de Leite Pasteurizado.

4. Contextualização

No Maranhão, segundo os dados do IBGE (2022), o percentual da população que vive abaixo da linha de pobreza é de 58,9%, isso inclui a chamada primeira infância, ou seja, crianças na faixa etária de 0 a 06 anos de idade. Em estudo realizado pelo “Observatório da FIOCRUZ”, o Maranhão foi o Estado com o segundo maior número de crianças com menos de um ano internadas com desnutrição no ano de 2022. Este dado

indica que, além da criança não receber a alimentação mínima necessária para manter as funções básicas do corpo humano, a mãe, no período da gestação, já deveria estar em um estado não ideal de nutrição, gerando um efeito cascata.

Desta forma, ações efetivas são necessárias para o enfrentamento dessa realidade, as quais serão realizadas a partir da implementação desse projeto, sendo, inicialmente, desenvolvidas pesquisas para o mapeamento e avaliação da Insegurança Alimentar e Nutricional grave nos municípios e avaliação de possíveis impactos dos equipamentos públicos de segurança alimentar e dos programas/projetos desenvolvidos nos municípios, na Implantação de um Sistema de Gestão/Monitoramento de equipamentos, programas/projetos de SAN. Isto permitirá o monitoramento e consequente avaliação da política de SAN; da Expansão/Implementação do Banco de Alimentos, que visa contribuir para a redução do desperdício de alimentos e combater a INSAN; da implantação de Sistemas Agroalimentares de Segurança Alimentar e Nutricional – SAASAN, fundamental para a produção de alimentos e geração de renda; da implantação e implementação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional-SISAN municipais, responsável por formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimulando a integração dos esforços entre governo e sociedade civil na promoção do direito à alimentação, bem como promove o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional nos municípios; e, por fim, da Implantação/Dinamização do Projeto “Leite para Todos” - Incentivo à Produção e ao consumo de Leite Pasteurizado.

5. Objetivo Geral

Contribuir para a redução da insegurança alimentar e nutricional de famílias com crianças, gestantes e pessoas em vulnerabilidade alimentar, como estratégia de enfrentamento à fome e à pobreza extrema.

5.1 Objetivos Específicos

- Mapear as famílias com alto percentual de insegurança alimentar nos municípios definidos;
- Monitorar, por meio de visitas, os municípios com elevado percentual de insegurança alimentar;
- Implantar o Sistema de Segurança Alimentar nos municípios sem cobertura;

- Atender famílias em vulnerabilidade social e insegurança alimentar com a aquisição de leite oriundo da agricultura familiar e a implantação de sistemas agroalimentares de SAN.

6. Vínculo do projeto a uma estratégia nacional/regional de política pública

Vinculado ao Eixo 5.6. Eixo de Desenvolvimento Social e Acesso a Serviços Públicos Essenciais, no Programa Bem-estar Social no âmbito do PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - PRDA. O projeto também possui vinculação ao segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que trata da promoção de ações de segurança alimentar.

7. Metodologia

7.1. Público-alvo do projeto

Famílias com criança de 0-6 anos (primeira infância) e gestantes em vulnerabilidade alimentar e nutricional.


Nº de ordem	Município	Meta (pessoas alcançadas)
01	Amapá do Maranhão	100
02	Araguanã	200
03	Boa Vista do Gurupi	200
04	Cândido Mendes	200
05	Carutapera	300
06	Centro do Guilherme	200
07	Centro Novo do Maranhão	200
08	Godofredo Viana	200
09	Governador Newton Belo	200
10	Governador Nunes Freire	300
11	Junco do Maranhão	100
12	Luis Domingues	200
13	Maracaçumé	200
14	Maranhãozinho	200
15	Nova Olinda do Maranhão	200
16	Presidente Médici	200
17	Santa Luzia do Paruá	300
18	Zé Doca	800
19	Apicum Açú	200

20	Bacuri	200
21	Bequimão	250
22	Cedral	200
23	Central do Maranhão	100
24	Cururupu	300
25	Guimarães	200
26	Mirinzal	200
27	Pedro do Rosário	300
28	Peri Mirim	200
29	Pinheiro	1.200
30	Porto Rico	100
31	Presidente Sarney	200
32	Santa Helena	600
33	Serrano do Maranhão	200
34	Turilândia	300
35	Turiaçu	300
TOTAL		8.650

7.2. Localização no território

Municípios selecionados:

Amapá do Maranhão, Araguañã, Boa Vista do Gurupi, Cândido Mendes, Carutapera, Centro do Guilherme, Centro Novo, Godofredo Viana, Governador newton Belo, Governador Nunes Freire, Junco do Maranhão, Luis Domingues, Maracaçumé, Maranhãozinho, Nova Olinda do Maranhão, Presidente Médice, Santa Luzia do Paruá, Zé Doca, Apicum Açú, Bacuri, Bequimão, Cedral, Central do Maranhão, Cururupu, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Peri Mirim, Pinheiro, Porto Rico, Presidente Sarney, Santa Helena, Serrano , Turilândia e Turiaçu.

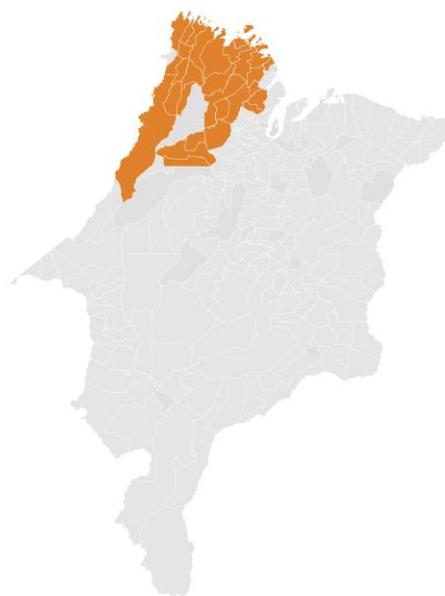

7.3. Procedimentos

O projeto visará e consubstanciar-se-á na integração entre as políticas de Assistência Social e a de Segurança Alimentar e Nutricional, ambas integrantes da missão desta Secretaria, sendo coordenadas e implementadas pelas Secretarias Adjuntas de Assistência Social-SAAS e pela Secretaria Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional-SASAN, respectivamente. Como forma de interação, as ações previstas, terão vinculação ao Programa PISSUAS/PCF, o qual tem o intuito de apoiar as crianças em seu desenvolvimento integral na primeira infância, que compreende a idade entre os 0 a 6 anos. Além disso, o programa visa facilitar o acesso da gestante, bem como das crianças às políticas e serviços públicos que necessitam, como educação, saúde, lazer, segurança alimentar, entre outros. A metodologia do programa é baseada em dois pilares sendo eles o da Visita Domiciliar a crianças e gestantes e a Intersetorialidade.

Desta forma, para a execução do objeto proposto, a metodologia será pautada nas seguintes ações:

- Realização de pesquisas para mapeamento e avaliação da Insegurança Alimentar e Nutricional grave nos municípios e avaliação de possíveis impactos dos equipamentos públicos de segurança alimentar e dos programas/projetos desenvolvidos, na redução da insegurança alimentar grave e melhoria dos Sistemas Agroalimentares dos Agricultores familiares;
- Implantação de um Sistema de Gestão/Monitoramento de equipamentos, programas/projetos de SAN
- Expansão/Implementação de Banco de Alimentos.
- Implantação de Sistemas Agroalimentares de Segurança Alimentar e Nutricional
- SAASAN.
- Implantação e implementação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional
- SISAN, municipais.

- Implantação/Dinamização do Projeto “Leite para Todos” - Incentivar a Produção e o consumo de Leite Pasteurizado e fortalecer a economia dos agricultores familiares.

7.4. Estudos Ambientais

Não se aplica.

8. Meta (s)/ Etapa(s) do projeto

Especificação:				Valor da Meta:				
Realizar pesquisas para mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional grave no estado e Avaliação de Possíveis Impactos dos equipamentos públicos de segurança alimentar na redução da insegurança alimentar grave e melhoria dos Sistemas Agroalimentares dos Agricultores familiares.				3.100.000,00				
META 1	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
	1.1	Instituições de pesquisa (parceiras de apoio à pesquisa e financiamento) ampliadas	dez/24			2.000.000,00	Custeio	2.000.000,00
	1.2	Carta de intenção elaborada (projeto de pesquisa para redução da insegurança alimentar e nutricional)	out/24			200.000,00	Custeio	200.000,00
	1.3	Fontes de financiamento garantidas	out/24	Relatório de pesquisa elaborado/1		-----	-----	-----
	1.4	Convênio assinado com Instituição de Ensino e Pesquisa para realização de pesquisas complementares	dez/24			-----	-----	-----
	1.5	Projeto de pesquisa relacionado à insegurança alimentar elaborado	ago/24			500.000,00	Custeio	500.000,00
	1.6	Resultado da pesquisa publicado	dez/26			200.000,00	Custeio	200.000,00
	1.7	Capacitação técnica realizada	dez/25			700.000,00	Custeio	200.000,00

Especificação da Meta: Implantar Sistema de Gestão/Monitoramento de equipamentos de SAN				Valor da Meta: 14.000.000,00				
META 2	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
	2.1	Dados e informações e possíveis integrações com outras bases de dados mapeados	dez/24			2.500.000,00	Custeio	2.500.000,00
	2.2	Parceria assinada com Agência Estadual de Tecnologia da Informação para desenvolvimento dos novos recursos do sistema com base no observatório de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)	dez/24			500.000,00	Custeio	500.000,00
	2.3	Adequação da Infraestrutura da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social para utilização e gerenciamento do sistema	dez/25			3.000.000,00	Investimento	3.000.000,00
	2.4	Equipamentos públicos de SAN preparados para coleta/sistematização de informações	dez/25			2.500.000,00	Investimento	2.500.000,00
	2.5	Capacitação dos operadores do sistema realizado	dez/25			500.000,00	Custeio	500.000,00
	2.6	Sistema integrado SAN implementado	dez/26			5.000.000,00	Investimento	5.000.000,00
	Sistema de SAN implementado e integrado							
Especificação: Expansão do Banco de Alimentos.				Valor da Meta: 582.500,00				
META 3	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
	3.1	Cadastro de novos doadores de alimentos e produtos variados para doação aos beneficiários mapeados	out/24			60.000,00	Custeio	120.000
	3.2	Fontes de financiamento identificados	out/24			-----	-----	-----
		Capacitação da equipe técnica e						

	3.3	operacional/ realização das atividades laborais	jan/25		13.500,00	Custeio	46.500,00
	3.4	Beneficiários capacitados com curso de aproveitamento integral dos alimentos e profissionalizantes	dez/25		33.500,00	Custeio	67.000
	3.5	Ações realizadas de forma personalizadas para Banco de Alimentos /redução de perdas	dez/25		49.500,00	Custeio	99.000
	3.6	Entidades de beneficiários cadastradas	dez/24		-----	-----	-----
	3.7	Aquisição equipamentos (implantação nova unidade)	Dez/26		250.000,00	Investimento	250.000,00

Especificação: Implantar Sistemas Agroalimentares de Segurança Alimentar e Nutricional - SAASAN.

Valor da Meta: 3.200.000,00

	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid .	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
META 4	4.1	Sistemas existentes nos municípios mapeados e analisados para indicação de melhoria	jul/25			1.000.000,00	Custeio	1.000.000,00
	4.2	Termo de referência elaborado e processo licitatório realizado	dez/24			-----	-----	-----
	4.3	Acordo de Cooperação Técnica assinado com a EMBRAPA, AGERP/MA e secretarias municipais de agricultura	nov/24			-----	-----	-----

	4.4	Capacitação técnica realizada	dez/25			1.000.000,00	Custeio	1.000.000,00
	4.5	SAASANs implantados e/ou aprimorados	dez/26			1.200.000,00	Investimento	1.200.000,00

Especificação: Implantar e implementar SISANs municipais. **Valor da Meta: 900.000,00**

META	Etapa	Descrição	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
META 5	5.1	Municípios mapeados com SISAN ou a implementar	dez/24	SISANs implantados /15		100.000,00	Custeio	100.000,00
	5.2	Municípios com apoio para institucionalizar o SISAN	dez/25			100.000,00	Custeio	100.000,00
	5.3	Secretarias municipais sensibilizadas	dez/24			-----	-----	-----
	5.4	Equipe municipal capacitada	jun/26			200.000,00	Custeio	200.000,00
	5.5	Apoio na formação de CAISAN e CONSEA realizado	dez/26			100.000,00	Custeio	100.000,00
	5.6	Conferência de SAN realizada	dez/26			300.000,00	Custeio	300.000,00
	5.7	Plano de SAN elaborado	dez/26			100.000,00	Custeio	100.000,00

Especificação: Leite para Todos **Valor: 7.900.000,00**

META	Etapa	Descrição	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valor unit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total
6	6.1	Marco legal construído	out/24	Projeto Leite para todos implantado		-----	—	-----
	6.2	Pesquisa estruturada	out/24			-----		-----

6.3	Secretarias de Assistência Social, de Agricultura, Sindicados, AGERP + Organizações da Sociedade Civil mobilizadas	out/24		200.000,00		200.000,00
6.4	Informações coletadas	ago/24		-----		-----
6.5	Lei do projeto aprovada	jun/25		—		—
6.6	Acordo de Cooperação Técnica elaborado e assinado com a EMBRAPA, AGERP e organizações da sociedade civil	dez/24		-----		-----
6.7	Sistemas mapeados e analisados para indicação de melhorias/ inovação tecnológica	dez/24		200.000,00		200.000,00
6.8	Projeto regulamentado (via decreto)	dez/24		-----		-----
6.9	Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência elaborados	ago/24		-----		-----
6.10	Processo licitatório realizado	dez/24		-----		
6.11	Capacitação técnica (técnicos das secretarias municipais, SEDES e produtores rurais) realizada	mar/25		1.000.000,00	Custeio	1.000.000,00
6.12	Acordo de Cooperação Técnica elaborado e assinado com as Secretarias Municipais de Agricultura e Assistência Social	mar/25		-----	-----	-----
6.13	Recursos captados via convênios	mar/25		-----	-----	—
6.14	Leite para todos implantado	dez/25		—	—	—

6.15	Distribuição de Leite	dez/26	6.500.000,00	Custeio	6.500.000,00
------	-----------------------	--------	--------------	---------	--------------

9. Resultado e Impacto esperado

Reduzir a desnutrição infantil grave de 5,5% para 2,5% até 2026;

10. Equipe gestora do projeto

10.1 Equipe executora

Nome	Messias Nicodemus da Silva		
Função no Projeto	Gerente/Ponto focal do projeto	Telefone para contato	(98) 99601-9505
E-mail	messias.silva@sedes.ma.gov.br		
Atividades a serem realizadas	Planejamento, execução, monitoramento e avaliação		
Instituição	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES)	Unidade/Setor	Secretaria Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional-SASAN

10.2 Equipe de apoio

Nome	Thaís Dias Chaves		
Função no Projeto	Coordenadora	Telefone para contato	(98) 98866-0407
E-mail	thaisdiasc@hotmail.com		
Perfil do pessoal de apoio	<input checked="" type="checkbox"/> Pessoa Física <input type="checkbox"/> Pessoa Jurídica	Tipo de contratação	Cargo Comissionado
Atividades a serem realizadas	Execução, monitoramento e avaliação		

Nome	Ingrid Damasceno		
Função no Projeto	Coordenadora	Telefone para contato	(98) 98818-1396

E-mail	ingridadamasceno@gmail.com		
Perfil do pessoal de apoio	[x] Pessoa Física [] Pessoa Jurídica	Tipo de contratação	Cargo Comissionado
Atividades a serem realizadas	Execução, monitoramento e avaliação.		
Nome	Andreia Cristina Sousa Reis Salles		
Função no Projeto	Coordenadora	Telefone para contato	98-981857376
E-mail	andreasales@hotmail.com		
Perfil do pessoal de apoio	[x] Pessoa Física [] Pessoa Jurídica	Tipo de contratação	Cargo comissionado
Atividades a serem realizadas	Execução, monitoramento e avaliação.		

11. Investimento

11.1. Fonte de recurso

Orçamento Geral da União (x)

Orçamento dos Estados ou Municípios ()

Outros fundos nacionais e internacionais, parcerias ()

Parcerias Público-Privadas ()

11.2. Valor do projeto

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO			
ORÇAMENTO ESTIMADO GLOBAL			
Tipo da despesa	TOTAL		
Despesas operacionais	R\$ 17.732.500,00		
Despesas de capital	R\$ 11.950.000,00		
TOTAL GERAL	R\$ 29.682.500,00		

ORÇAMENTO ESTIMADO POR ANO			
Tipo da despesa	2024	2025	2026
Despesas operacionais	8.866.250,00	8.866.250,00	-
Despesas de capital	5.975.000,00	5.975.000,00	-
TOTAL	14.841.250,00	14.841.250,00	29.682.500,00

FONTES DE RECURSOS PREVISTAS	
Fonte	Valor
Recursos próprios	-
Transferências de convênios com o Governo Federal	29.682.500,00
Demais transferências do Governo Federal	
Transferências de outras instituições públicas	-
Transferências de instituições privadas	-
Transferências provenientes de depósitos não identificados (doações)	-
Operações de crédito	-
TOTAL	29.682.500,00

11.3. Cronograma Físico-Financeiro

ID	Metas/Tarefas	Unidade/Responsável	Início	Término
1	Realizar pesquisas para mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional grave no estado e Avaliação de Possíveis Impactos dos EPSAN's na redução da INSAN Grave e melhoria dos Sistemas Agroalimentares dos Agricultores familiares	SEDES/SASAN	08/2024	12/2026
2	Implantar sistema de Gestão/Monitoramento de equipamentos de SAN	SEDES/SASAN	12/2024	12/2026
3	Expandir Banco de Alimentos	SEDES/SASAN	10/2024	12/2026
4	Implantar sistemas Agroalimentares de Segurança Alimentar e Nutricional - SAASAN.	SEDES/SASAN	11/2024	12/2026
5	Implantar e implementar SISAN municipais	SEDES/SASAN	12/2024	12/2026
6	Leite para Todos - Incentivar a Produção e o consumo de Leite Pasteurizado.	SEDES/SASAN	08/2024	12/2026

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
1	Contratações de RH	-----	-----	-----
	Instalações preliminares	-----	-----	-----
	Máquinas e equipamentos	-----	-----	-----
	Obras/ Instalações	-----	-----	-----
	Passagens	-----	-----	-----
	Diárias	-----	-----	-----
	Outros Serviços	2.000.000,00	1.100.000,00	3.100.000,00
	Total R\$	2.000.000,00	1.100.000,00	3.100.000,00

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
2	Contratações de RH	-----	-----	-----
	Instalações preliminares	1.000.000,00	-----	-----
	Máquinas e equipamentos	3.000.000,00	2.000.000,00	-----
	Obras/ Instalações	3.000.000,00	-----	-----
	Passagens	-----	-----	-----
	Diárias	-----	-----	-----
	Outros Serviços	3.500.000,00	1.500.000,00	-----
	Total R\$	10.500.000,00	3.500.000,00	14.000.000,00

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
3	Contratações de RH	-----	-----	-----
	Instalações preliminares	-----	-----	-----
	Máquinas e equipamentos	-----	-----	-----
	Obras/ Instalações	250.000,00	-----	250.000,00
	Passagens	-----	-----	-----
	Diárias	-----	-----	-----
	Outros Serviços	332.500,00	-----	332.500,00
	Total R\$	582.500,00	-----	582.500,00

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
4	Contratações de RH	-----	-----	-----
	Instalações preliminares	-----	-----	-----
	Máquinas e equipamentos	1.200.000,00	-----	1.200.000,00
	Obras/ Instalações	-----	-----	-----
	Passagens	-----	-----	-----
	Diárias	-----	-----	-----
	Outros Serviços	2.000.000,00	-----	2.000.000,00
	Total R\$	3.200.000 ,00	-----	3.200.000,00

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
5	Contratações de RH	-----	-----	-----
	Instalações preliminares	-----	-----	-----
	Máquinas e equipamentos	-----	-----	-----
	Obras/ Instalações	-----	-----	-----
	Passagens	-----	-----	-----
	Diárias	-----	-----	-----
	Outros Serviços	900.000,00	-----	900.000,00
	Total R\$	900.000,00	-----	900.000,00

Tarefa ID	Elementos de dispêndio para cada meta	Ano 1 R\$	Ano 2 R\$	Total R\$
6	Contratações de RH	-----	-----	-----
	Instalações preliminares	-----	-----	-----
	Máquinas e equipamentos	-----	-----	-----
	Obras/ Instalações	-----	-----	-----
	Passagens	-----	-----	-----
	Diárias	-----	-----	-----
	Outros Serviços	5.000.000,00	2.900.000,00	7.900.000,00
	Total R\$	5.000.000,00	2.900.000,00	7.900.000,00

12 Gestão de Risco

12.1. Indicador do projeto

O indicador será o “Percentual de crianças na primeira infância em Insegurança Alimentar e Nutricional”. O monitoramento será realizado em parceria com os Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional e os Comitês Gestores Municipais do Programa Primeira Infância no SUAS/PCF o qual tem, nas Multiplicadoras estaduais, o meio de acompanhamento e assessoramento técnico aos supervisores

municipais/regionais, com o uso de instrumentais específicos, associado às capacitações das equipes

12.2. Análise de Risco

Ações ou Eventos de riscos à execução do projeto	Ações preventivas conter os riscos	Ações Corretivas para mitigar os riscos concretos
1. Falta de propostas de laticínios/cooperativas/associações para fornecimento de leite.	Busca constante por novos laticínios/cooperativas/associações; Negociações por acordos de benefício mútuo;	-----
2. Vínculo empregatício incerto	Contratação efetiva	Realização de concurso
3. Gestão ineficaz dos recursos	Planejamento, implantação e monitoramento dos recursos	Realização de Capacitações

Referências

Plano Estratégico de Longo Prazo Maranhão 2050.

Anexos
